

令和8年度の工事計画

①洗車排水処理
設備の更新

⑤タンク新設
（半製品、生石灰、乾燥灰）
（3年間）

④調合ブレンダ
ろ過式集じん機の更新

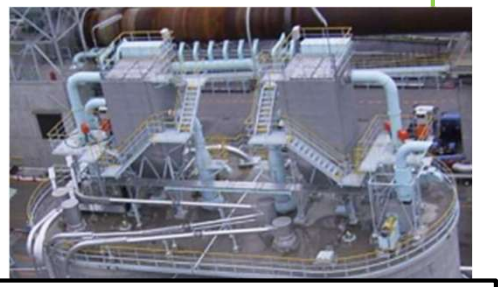

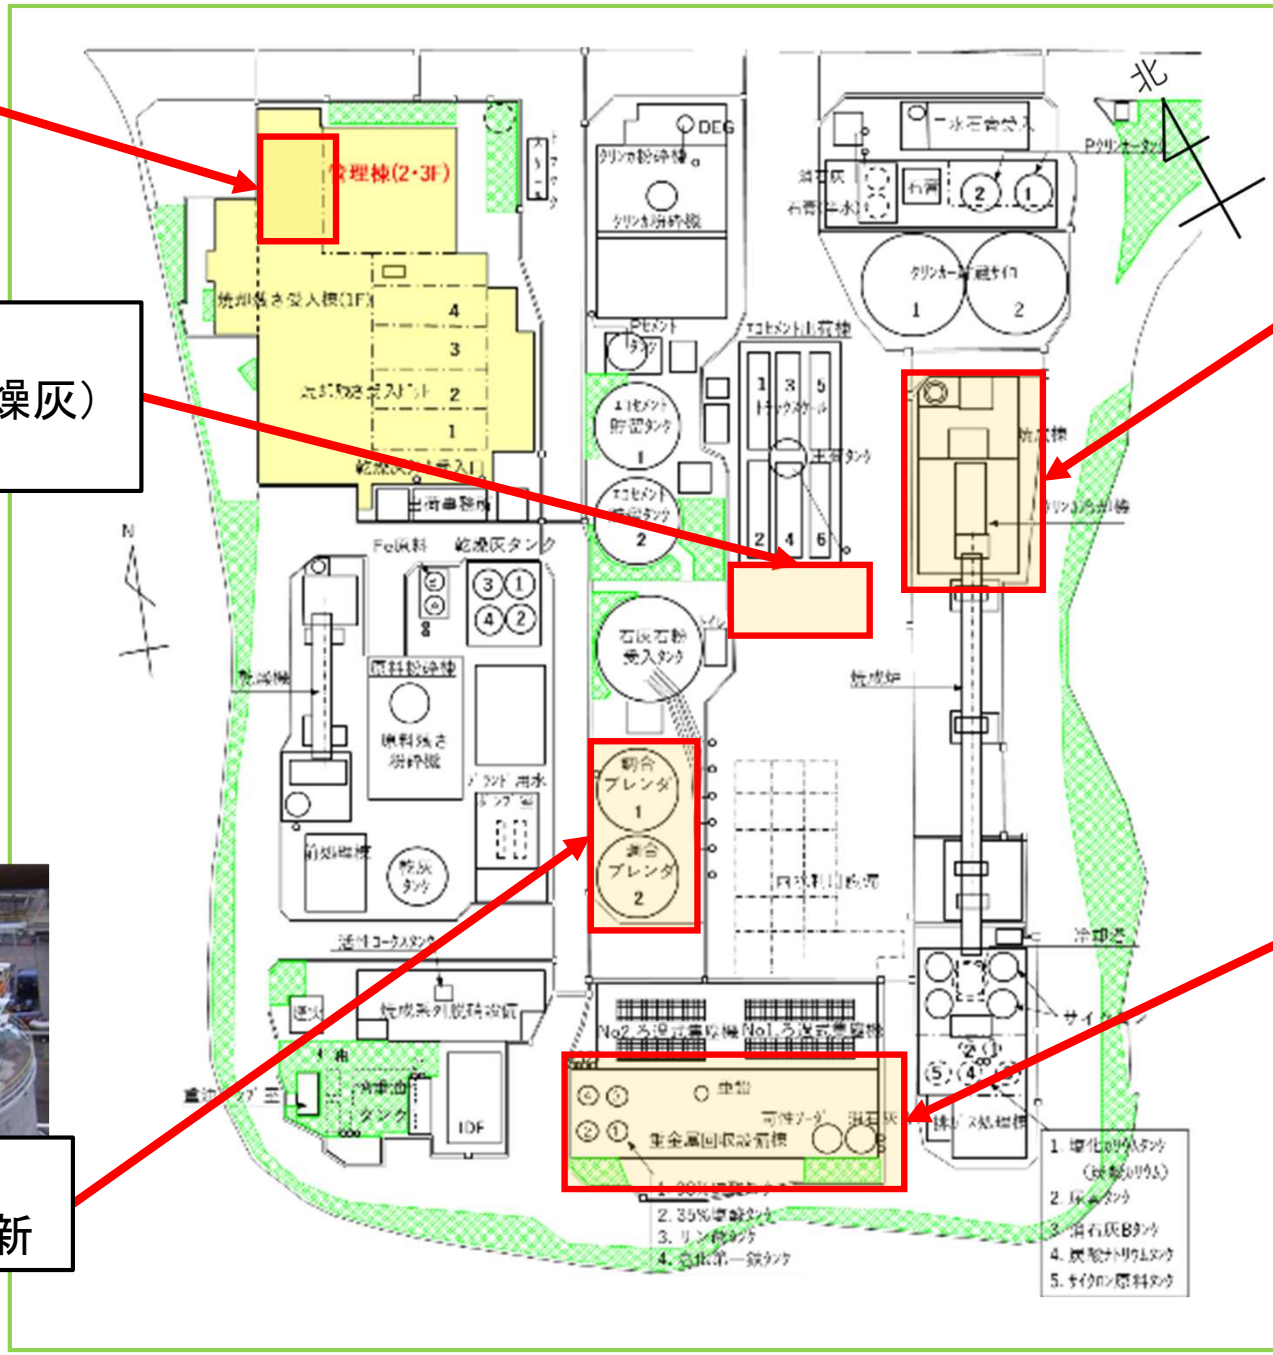

②重金属回収設
備の全更新
（5年間）




③クリンカ冷却設備ろ
過式集じん機の更新

①洗車排水処理設備の更新

＜役割＞　焼却残さ搬入車両がプラットフォームから退出する際、タイヤに付着した焼却残さを棟外へ持ち出されないように、出口でタイヤを洗浄する。その際に発生する排水を処理する装置

＜更新箇所＞　排水処理装置の全体

工事スケジュール

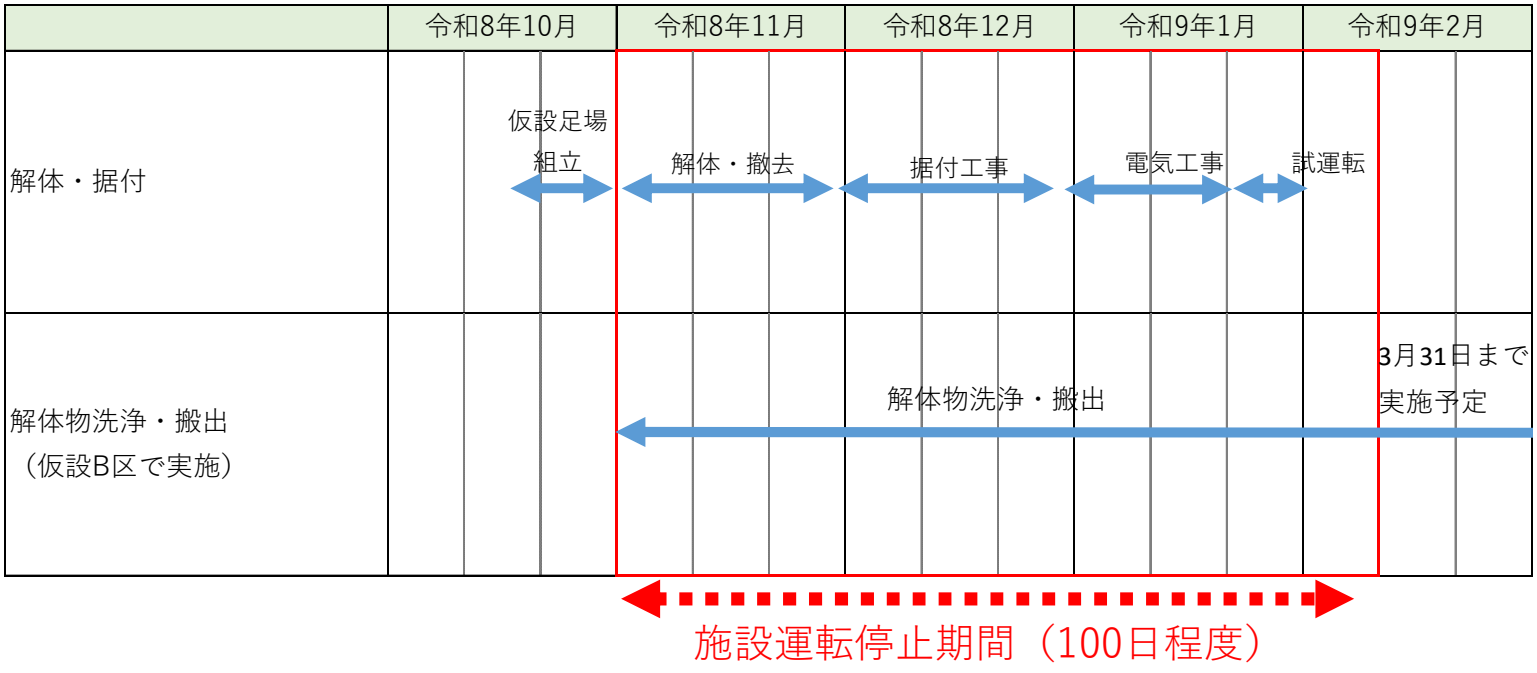





②重金属回収設備の全更新（一部実施）

〈役割〉　焼成炉から発生する焼成飛灰から有用な金属（銅、鉛、亜鉛等）を分離回収するとともに、施設全体から排出するプラント排水を無害化する設備

〈更新箇所〉　重金属回収設備棟南東側１～2階のタンク、機器、配管（R９年度以降フィルタープレス機、薬液タンク等を更新予定

工事スケジュール※

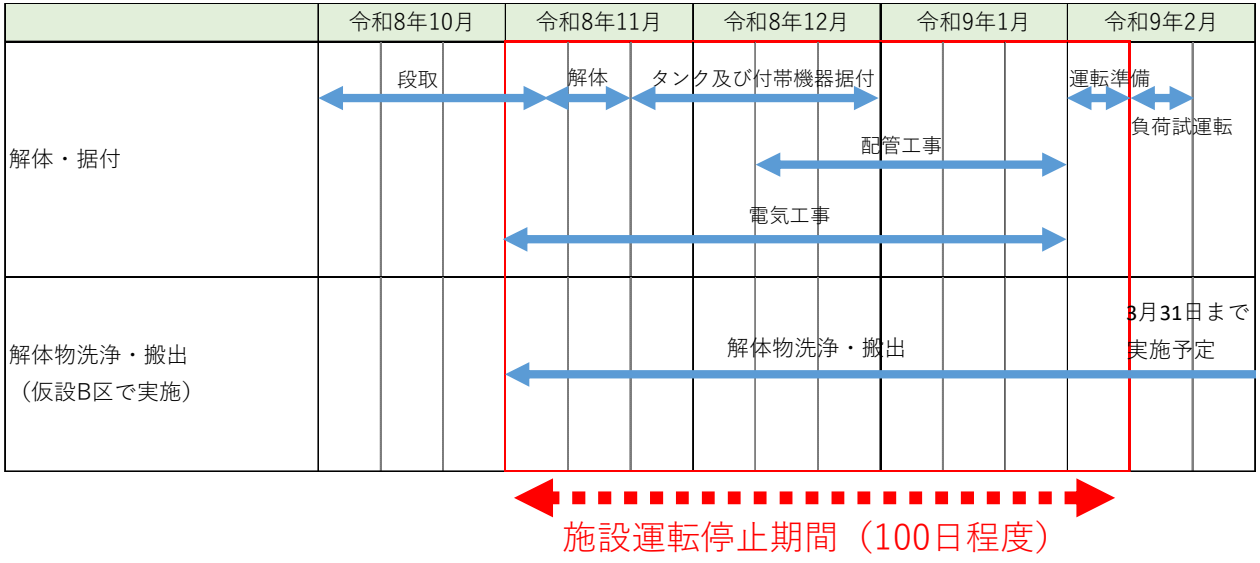

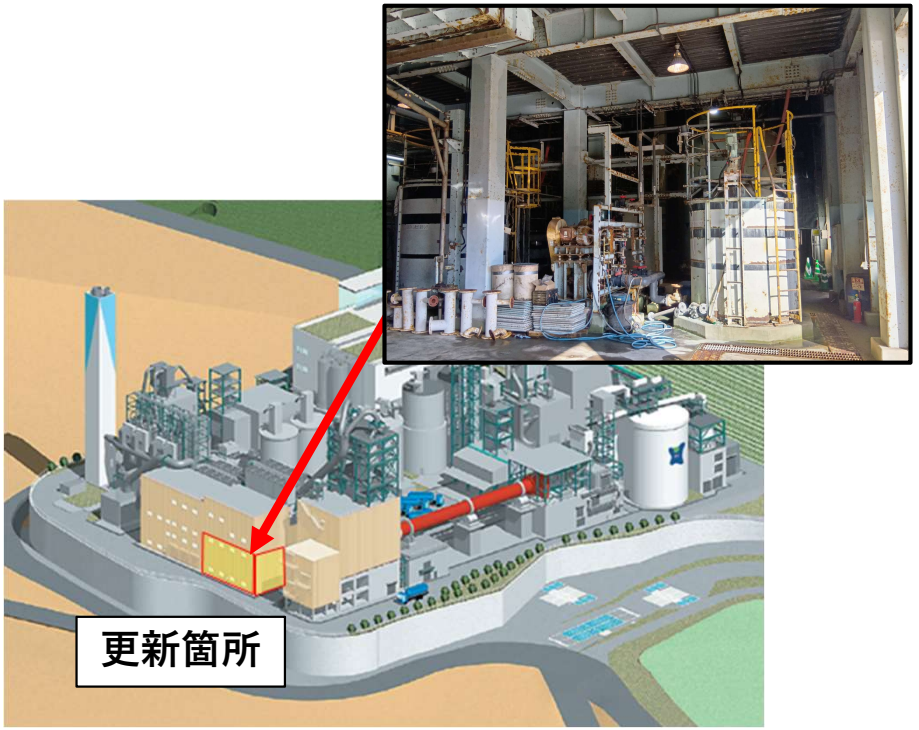


※重金属回収設備の改良工事は屋内等で夜間作業（16時～9時、100日程度）も行います。

③クリンカ冷却設備ろ過式集じん機の更新

〈役割〉　　クリンカ冷却設備でクリンカと熱交換された空気の一部に含まれる粉じんを浄化し、大気に放出するためのろ過式集じん機

〈更新箇所〉　ろ過式集じん機本体及び付随するコンベアを更新する

工事スケジュール

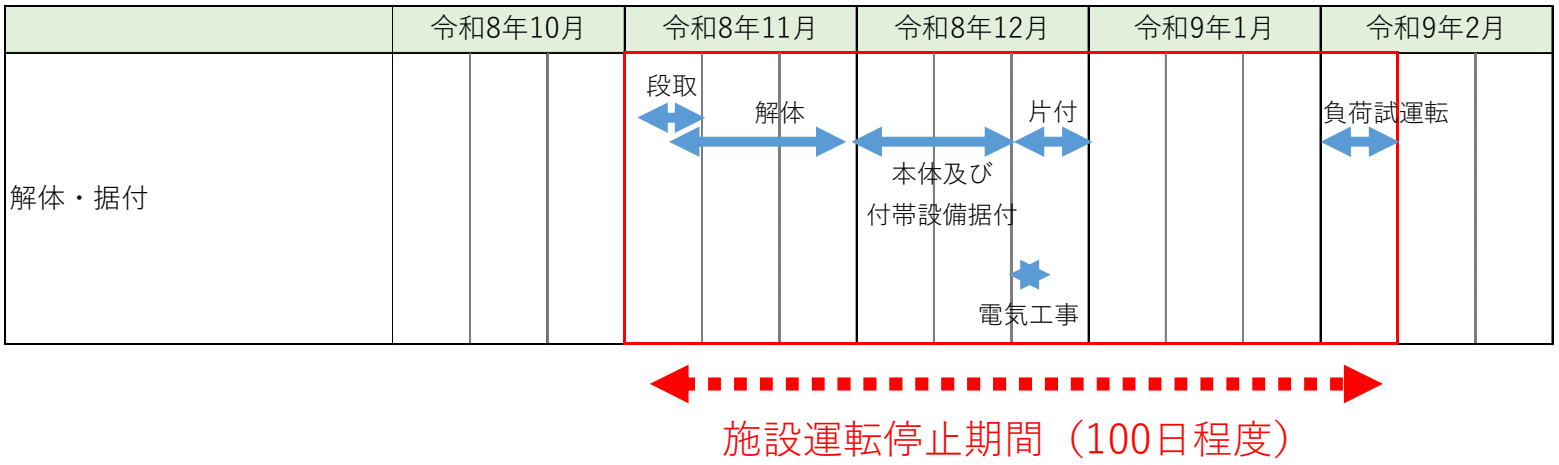




④調合ブレンダろ過式集じん機の更新

〈役割〉　前処理された焼却残さ、生石灰及び副原料を焼成前に調合、混合する際に発生した粉じんを浄化して大気に放出するためのろ過式集じん機

〈更新箇所〉　ろ過式集じん機本体及び付随するコンベア

工事スケジュール

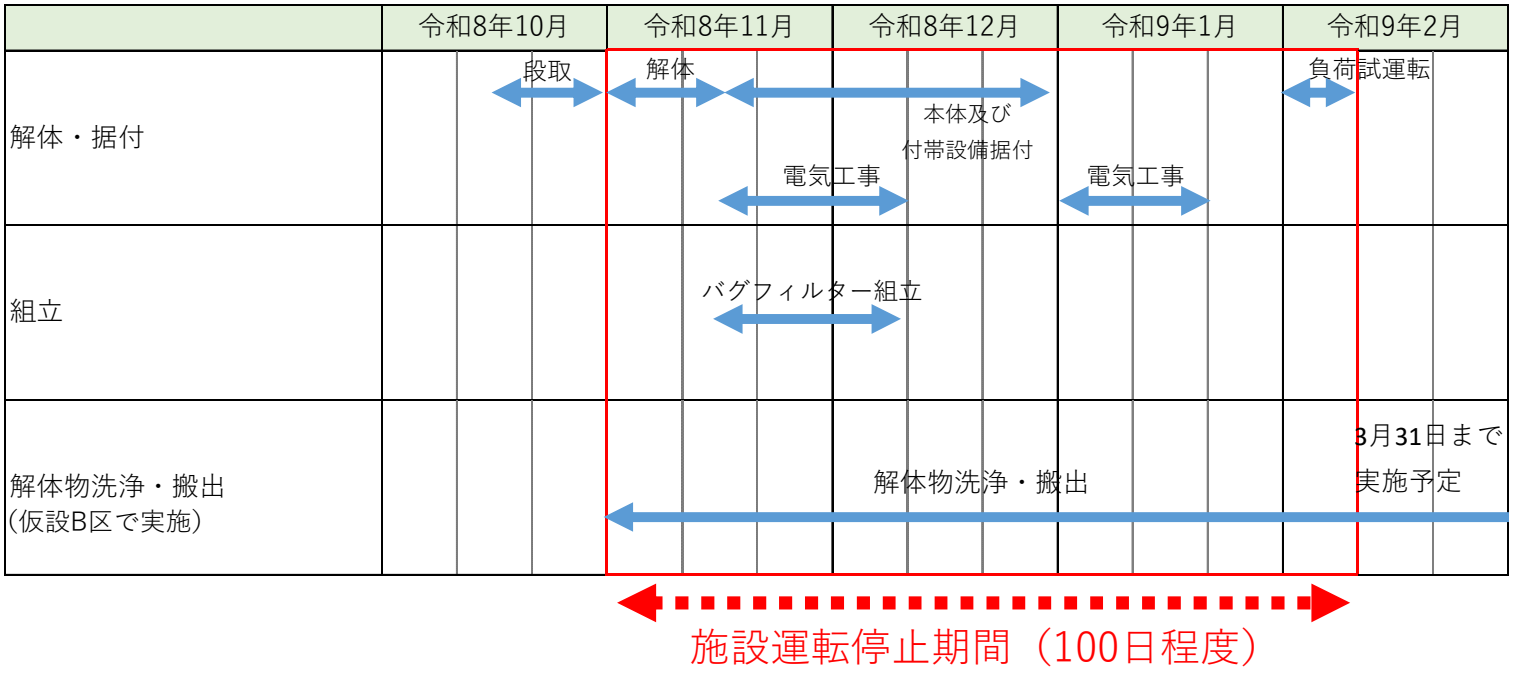




⑤タンク新設(半製品、生石灰、乾燥灰）（一部実施）

〈役割〉　エコセメントの原料である生石灰、乾燥灰及びエコセメントの半製品を一時貯留するためのタンク（CO_2削減対策、災害廃棄物処理体制強化等のため）

〈工事内容〉　新設するタンク3基(半製品、生石灰、乾燥灰)の基礎工事（R9年度はタンクを支える鉄骨支柱建設、R10年度にタンク3基設置）

工事スケジュール

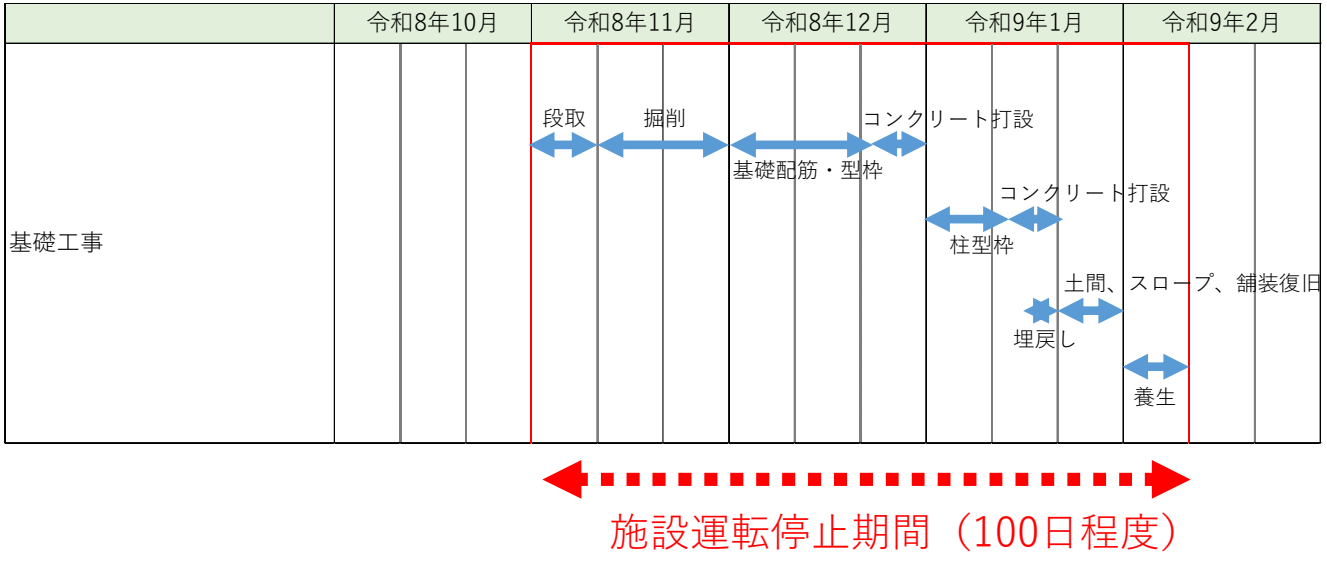

設置箇所

